Id.	Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozpoczęcie	Zakończenie
1	Faza Zapoczątkowanie	108 dn	czw, 07-11-01	pon, 08-03-31
2	**Faza Projektowa**	239 dn	pią, 08-02-01	śro, 08-12-31
3	**Projekt Koncepcyjny**	64 dn	pią, 08-02-01	śro, 08-04-30
4	Wykonanie Projektu Zagospadarowania	42 dn	pią, 08-02-01	pon, 08-03-31
5	Wykonanie Projektu Stadionu	64 dn	pią, 08-02-01	śro, 08-04-30
6	**Projekt Budowlany**	66 dn	czw, 08-05-08	czw, 08-08-07
7	Projekt wymagany do wniosku o PnB	61 dn	czw, 08-05-08	czw, 08-07-31
8	Aktualizacja Budżetu	66 dn	czw, 08-05-08	czw, 08-08-07
9	**Projekt Wykonawczy**	170 dn	czw, 08-05-08	śro, 08-12-31
10	Projekt Wykonawczy Robót Ziemnych	104 dn	czw, 08-05-08	wto, 08-09-30
11	Projekt Wykonawczy Stadionu	170 dn	czw, 08-05-08	śro, 08-12-31
12	**Pozwolenia**	139 dn	śro, 08-03-19	wto, 08-09-30
13	Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej	0 dn	śro, 08-03-19	śro, 08-03-19
14	Wydanie decyzji lokalizacyjnej	0 dn	nie, 08-06-01	nie, 08-06-01
15	Wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środ.	0 dn	śro, 08-03-19	śro, 08-03-19
16	Wydanie decyzji uwarunkowań środ.	0 dn	czw, 08-07-10	czw, 08-07-10
17	Wniosek Pozwolenie na Budowe	0 dn	pią, 08-08-29	pią, 08-08-29
18	Decyzja Pozwolenia na Budowe	0 dn	wto, 08-09-30	wto, 08-09-30
19	**Przetargi**	229 dn	śro, 08-06-04	wto, 09-04-21
20	**Przetarg na roboty ziemne**	139 dn	śro, 08-06-04	wto, 08-12-16
21	Ogłoszenie	0 dn	śro, 08-06-04	śro, 08-06-04
22	Podpisanie Umowy	0 dn	wto, 08-12-16	wto, 08-12-16
23	**Przetarg na budowe stadionu**	211 dn	pon, 08-06-30	wto, 09-04-21
24	Ogłoszenie	0 dn	pon, 08-06-30	pon, 08-06-30
25	Podpisanie Umowy	0 dn	wto, 09-04-21	wto, 09-04-21
26	**Faza Budowy**	708 dn	wto, 08-04-08	czw, 10-12-23
27	Roboty wyburzeniowe i oczyszczeniowe	109 dn	wto, 08-04-08	pią, 08-09-05
28	**Roboty Ziemne**	181 dn	pią, 09-01-02	pią, 09-09-11
29	Prace Melioracyjne	181 dn	pią, 09-01-02	pią, 09-09-11
30	Wymiana Gruntu	181 dn	pią, 09-01-02	pią, 09-09-11
31	**Konstrukcja Stadionu**	434 dn	pon, 09-04-27	czw, 10-12-23
32	**Procedury odbioru końcowych obiektu**	114 dn?	czw, 10-12-23	wto, 11-05-31
33	**Procedura przekazania obiektu do użytkowania**	22 dn?	śro, 11-06-01	czw, 11-06-30

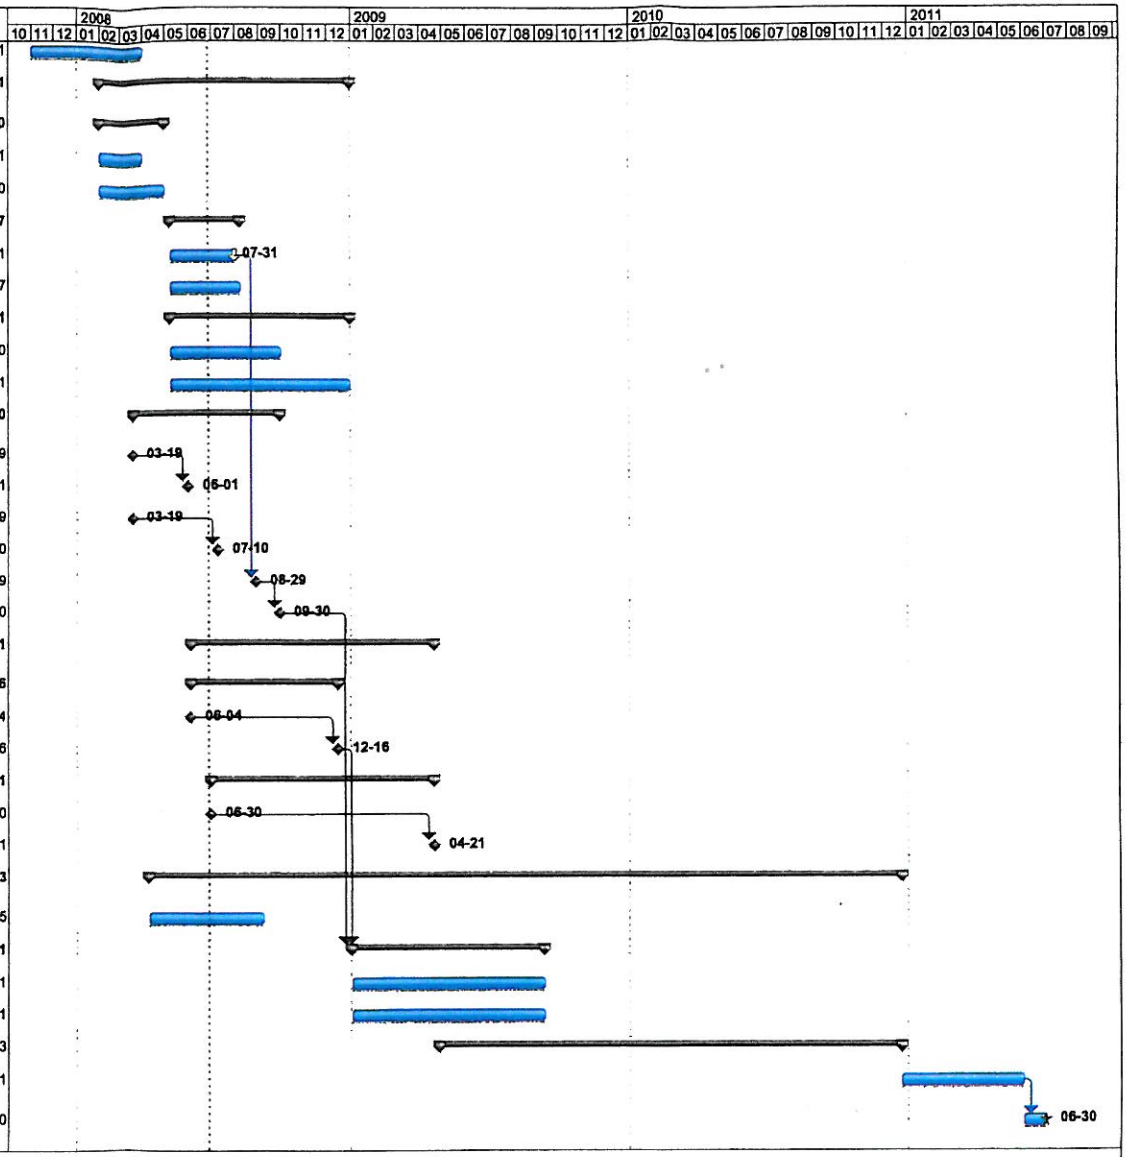

Projekt: Baltic Arena Timetable_KK -p
Data: czw, 08-06-26

Zadanie — Postęp — Podsumowanie — Zadania zewnętrzne — Termin ostateczny
Podział — Punkt kontrolny — Podsumowanie projektu — Zewnętrzne punkty kontrolne

PREZES ZARZĄDU
Ryszard [illegible]
